



RIKTLINJER I SAMVERKAN  
VÄSTRA GÖTALAND

Riktlinjer I  
samverkan - RIS

2008-09-05

---



RIKTLINJER I SAMVERKAN  
VÄSTRA GÖTALAND

**Projektplan** gällande implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland – ett samverkansprojekt mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården region Väst



Kriminalvården





## Innehåll

<b>1</b>	<b>Basfakta</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Projektidé och mål</b> .....	<b>4</b>
	2.1 Bakgrund och projektidé .....	4
	2.2 Projektmål, uppdrag och målgrupp .....	4
	2.3 Avgränsningar.....	5
<b>3</b>	<b>Rapportering och överlämning</b> .....	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Organisation och bemanning</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Tidsplan och resurser</b> .....	<b>6</b>
	5.1 Beskrivning tidplan.....	6
	5.2 Resurser .....	7
<b>6</b>	<b>Arbetsformer</b> .....	<b>7</b>
	6.1 Metod.....	7
	6.2 Återföring av implementeringskunskap.....	8
	6.3 Informationsspridning .....	8
	6.4 Förväntat resultat vid projekttidens slut .....	8
	6.5 Avvikelse- och ändringshantering.....	9
<b>7</b>	<b>Risker och möjligheter</b> .....	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Utvärdering</b> .....	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>Referensdokument</b> .....	<b>9</b>



# 1 Basfakta

## Godkännande av projektplan och bilagor

Projektplanen godkänd av;

Styrgrupp:

Projektledare:

.....  
Christina Möller

.....  
Göran Eriksson

.....  
Jan-Eric Josefsson

.....  
Kristina E Olsson

.....  
Pia Jonsson-Axelsson

.....  
Malin Sparrström Olers

.....  
Katarina Thunander

.....  
Alf Midholm

## Bilagor

Bilaga	Dokumentnamn	Utgåva, datum
1	Referenspersoner	
2	Delregionala Arbetsgrupper	
3	Uppdragshandling för projektet	2008-01-24
4	Tidplan för projektet	

## 2 Projektidé och mål

### 2.1 Bakgrund och projektidé

Socialstyrelsen publicerade i februari 2007 - Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna vänder sig till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter samt viktiga samarbetspartners som Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS) med flera. Efter det att riktlinjerna publicerats har ett särskilt implementerings- och utbildningsstöd också utarbetats och publicerats (juli 2007) av Socialstyrelsen.

VästKom och Västra Götalandsregionen ansökte, i maj 2007, hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om utvecklingsmedel för implementering av de Nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevård. Medel söktes för att under två år bedriva projektet i samverkan – för bekostnad av projektledare, utbildning av kompetensstödjare, anordning av delregionala halvdagskonferenser samt för informations- och kommunikationstjänster. Ansökan innehöll även en inbjudan till Kriminalvården om att medverka i projektet. I oktober 2007 gjorde Kriminalvården en kompletterande ansökan om projektmedel, de ställde sig bakom VästKom och Västra Götalandsregionens ansökan.

Västkom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården region Väst har erhållit projektmedel från Länsstyrelsen Västra Götaland för implementering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

### 2.2 Projektmål, uppdrag och målgrupp

Projektmålet är att, genom samverkan mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården region Väst, nå det övergripande målet att den kunskap som finns i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård blir känd och använd i missbruks- och beroendevården i Västra Götaland.

Projektets uppdrag är att stimulera till lokalt implementeringsarbete i hela länet, utifrån lokala förutsättningar. För detta kommer delregionala kunskapskonferenser att anordnas och delregionala arbetsgrupper att bildas utifrån befintliga samverkansstrukturer. Lokalt utsedda kompetensstödjare kommer att erbjudas utbildning. Information om projektet kommer att finnas på projektets hemsida.

Projektets målgrupp är berörd personal inom socialtjänst, sjukvård (sluten- och primärvård) samt kriminalvård (frivård) som möter eller vårdar personer som löper risk för och/eller har ett etablerat missbruk / beroende. Medarbetare hos Statens Institutionsstyrelse och vissa privata aktörer kan komma att bjudas in, till av projektet anordnade aktiviteter.

Projektets huvudsakliga syfte är att samverkan mellan de tre huvudmännen på lokal nivå når en kvalitet som slutligen kommer den enskilde till del. Projektet uppmuntrar därför till gemensamma mötesplatser för studier av riktlinjerna. Vid projekttidens slut bör man ha nått fram till goda strukturer för samverkan både lokalt och länsövergripande inom missbruks- och beroendevården i Västra Götaland. Dessa strukturer bör resultera i förbättrade samverkansrutiner, i hela länet.

## 2.3 Avgränsningar

Projektets uppdrag är i första hand begränsat till anordnande av konferenser, stöd till och kommunikation med delregionala arbetsgrupper samt kompetensstödjare. Det innebär att primärt förankra från chefsnivå och vidare mot kompetensstödjare. Det lokala riktlinjearbetet struktureras och organiseras av lokala beslutsfattare. I mån av tid och utrymme kan projektet bidra med information och stöd till lokala arbetsgrupper.

## 3 Rapportering och överlämning

Beskrivning	Mottagare	Datum
Internrapportering via projektplatsen.se	Inom projektledargruppen	Löpande
Rapportering av ekonomi, tidplan, konferenser, omvärldskommunikation.	Styrgruppen	Månadsvis
Delrapport	Länsstyrelsen	December 2008
Slutrapport	Länsstyrelsen	Mars 2010

## 4 Organisation och bemanning

Roll	Bemanning	Tel/E-postadress
Styrgrupp	Christina Möller Regionkansliet, Västra Götalandsregionen Samordnare	christina.moller@vgregion.se 0500-495 642
	Pia Jonsson-Axelsson Skaraborgs Kommunalförbund Samordnare	pia.jonsson-axelsson@skaraborg.se 0708-487 204, 0500- 497 204
	Jan-Eric Josefsson Kriminalvården region Väst Stabschef	jan-eric.josefsson@kriminalvarden.se 0708- 311 001

Roll	Bemanning	Tel/E-postadress
Projektledare	Alf Midholm Social Resursförvalning. Göteborg Socialsekreterare	alf.midholm@socialresurs.goteborg.se 031-367 93 29
	Katarina Thunander Socialtjänsten, Falköping Sektionschef	katarina.thunander@falkoping.se 0515-885 312
	Göran Eriksson Primärvården Göteborg, Västra Götalandsregionen Studierektor allmän medicin	goran.eriksson@vgregion.se 0705-710 567
	Kristina Olsson NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Specialsjuksköterska missbruk / psykisk sjukdom	kristina.e.olsson@vgregion.se 0768-442 864
	Malin Sparrström Olers Kriminalvården region Väst Verksamhetsutvecklare	malin.sparrstrom.olars@kriminalvarden.se 0708-311 029

## 5 Tidsplan och resurser

### 5.1 Beskrivning tidplan

(En mer detaljerad beskrivning av tidsplanen återfinns i bilaga 4)

Datum	Beskrivning
Våren 2008	Projektledare anställs
Sommaren 2008	Projektplan arbetas fram och olika aktiviteter förbereds
Hösten 2008	Inledande träffar med delregionala arbetsgrupper
Hösten 2008	Delregionala halvdagskonferenser påbörjas, pågår även 2009
2009	Utbildning av kompetensstödjare

## 5.2 Resurser

Projektet är beviljat projektmedel till en summa av 5 820 000 kronor fördelade på två år. Ekonomin för projektet kommer att redovisas särskilt. Projekttiden löper från den 3 mars 2008 fram till den 28 februari 2010. Villkoret för utbetalning av projektmedlen är att arbetet samordnas med Sociala Resursnämnden i Göteborg, som även beviljats utvecklingsmedel för implementering av Nationella Riktlinjer inom Göteborgs Stad.

Område	Resursfördelning
Projektledning	tre heltidstjänster fördelat på fem personer
Föreläsningar	Tjugo delregionala konferenser
Tvådagars internat	kompetensstödjare
Information och kommunikation	100 000 kronor

## 6 Arbetsformer

### 6.1 Metod

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska användas hos olika huvudmän, med olika lagstiftning, organisation, attityder och värderingar, vilket förutsätter ett gemensamt gränsöverskridande lärande. Västra Götalandsregionen delas in i fyra delregioner, Fyrbodals, Skaraborg, Sjuhärad och Göteborg med kranskommuner. Projektets tänkta organisation framgår av uppdragshandling, bilaga 3.

- Projektet kommer att anordna *konferenser* om de olika kapitlen i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i syfte att öka kunskapen om innehållet i riktlinjerna. Dessa konferenser kommer företrädesvis att anordnas lokalt, i de fyra delregionerna. Projektet ser gärna att deltagarna kommer från samma delregion, från olika huvudmän för att gemensamt öka sina kunskaper inom området – en samverkande utbildningsinsats.
- Ett övergripande och normativt arbete kommer att ske i *delregionala arbetsgrupper*, som utgörs av chefer från de tre huvudmännen i varje delregion. Dialogen med dessa grupper syftar till att ta ett gemensamt och tydligt grepp över hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa strukturer för samverkan. Gemensam organisation av studiarbetet kring riktlinjerna stimulerar till samsyn och ökad samverkan.

- *Utbildning av kompetensstödjare* – lokalt utsedda representanter från huvudmännen kommer att erbjudas utbildning för att kunna utgöra ett konkret stöd i implementeringsarbetet av riktlinjerna lokalt och i samverkan. Dessa behöver få ett tydligt mandat för sitt uppdrag från den egna arbetsgivaren.
- *Frageställningarna i Socialstyrelsens implementeringsstöd* bör användas i det lokala implementeringsarbetet – dock kan metodiken för detta arbete avgöras lokalt. Det är viktigt att hitta mötesplatser för diskussion, där man kan lyfta likheter och skillnader i kunskap, förklaringsmodeller och regelsystem.
- Projektet kommer att sträva efter att *följa den nationella utvecklingen* på området bland annat via kontakt med Forskningsrådet för Missbruks- och beroendefrågor FMB / GU och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vidare har projektet knutit till sig utvalda referenspersoner (se bilaga 1) för rådgivning i förekommande fall.

## 6.2 Återföring av implementeringskunskap

Som en viktig del i en lärandeprocess ser projektet att den kunskap som inhämtas under projektets gång, i mötet med berörd personal, chefer och beslutsfattare, kan återföras och bidra till projektets utveckling.

## 6.3 Informationsspridning

Information om projektets arbete kommer att kunna följas på projektets hemsida [www.riktlinjerivast.se](http://www.riktlinjerivast.se). För att förenkla tillgången till ny information kan man prenumerera på nyheter som läggs in kontinuerligt. Länk till projektets hemsida finns även på [www.kunskapskallarn.goteborg.se](http://www.kunskapskallarn.goteborg.se)

## 6.4 Förväntat resultat vid projekttidens slut

Vid projekttidens slut, mars 2010, bör följande vara uppnått;

- De nationella riktlinjerna är kända och används som kunskapsbas i arbetet och som grund för samverkan
- Utbildade kompetensstödjare för de olika aktörerna finns och de arbetar lokalt med att kunskapen i riktlinjerna omsätts i praktiken
- De delregionala arbetsgrupperna arbetar aktivt med identifiering av samverkansbehov och har påbörjat arbetet med att utforma gemensamma riktlinjer för samverkan kring enskilda ärenden
- De tre organisationerna har börjat förtydliga riktningen mot gemensamma utrednings- och kartläggningsinstrument

## 6.5 Avvikelse- och ändringshantering

Beslut om ändringar som inte påverkar uppdragets tids- och kostnadsramar fattas av projektgruppen med återrapportering till styrgruppen. Ändringar som påverkar tid- och kostnadsramar skall beslutas av styrgruppen.

## 7 Risker och möjligheter

Projektets uppdrag innebär att under projekttiden observera hinder och möjligheter för samverkan mellan de tre huvudmännen. För att kartlägga detta kommer projektet under projekttidens gång att använda sig av SWOT-analys som arbetsredskap.

## 8 Utvärdering

Projektet kommer att utvärderas av extern utvärderare. Särskilda utvecklingsmedel kommer att sökas för detta ändamål.

## 9 Referensdokument

Ref.nr.	Dokumentnamn, dokumentbeteckning	Utgåva, datum
1	Beslut om projektmedel	2007-11-02
2	Överenskommelse mellan Staten och SKL	2008-04-24 nr III:6
3	Utvecklingsmedel till "Vårdöverenskommelsen" – bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk	2007-11-02
4	Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård	Februari 2007
5	Implementerings- och utbildningsstöd, nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård	Juli 2007



## Bilaga 1

### Referenspersoner för RIS projektet

<p><b>Gunilla Nilsson</b> Handläggare klient och säkerhetsenheten Kriminalvårdens Huvudkontor, <u>Kriminalvården</u> tel 0708- 275 668 <a href="mailto:gunilla.nilsson@kriminalvarden.se">gunilla.nilsson@kriminalvarden.se</a></p>	<p><b>Elisabeth Punzi</b> Narkotikafrågor och ASI Beroendepsykiatri VGR , tel 0704- 062 48 <a href="mailto:elisabeth.punzi@vgregion.se">elisabeth.punzi@vgregion.se</a></p>
<p><b>Magnus Geirsson</b> Distriktsläkare, doktorand i Skövde <u>Primärvården VGR</u> tel 0703- 961645 <a href="mailto:magnus.geirsson@vgregion.se">magnus.geirsson@vgregion.se</a></p>	<p><b>George Fischer</b> ASI/DOK samordnare Fyrbodals <u>Metodstödjare kommunalförbundet</u> tel 0522-440834 <a href="mailto:georg.fischer@fyrbodals.se">georg.fischer@fyrbodals.se</a></p>
<p><b>Per Blanck</b> Implementerings- och utvärderingskunskap <u>Socialmedicinska enheten, Göteborgs universitet</u> tel 0705-583121 <a href="mailto:per.blanck@socmed.gu.se">per.blanck@socmed.gu.se</a></p>	<p><b>Sonny Wählstedt</b> Representant från brukarorganisation <u>NSPH , Nationell Samverkan Psykisk Hälsa</u></p>
<p><b>Lennart Rådenmark</b> Länssamordnare, Socialenheten Länstyrelsen Västra Götaland tel 031- 605 289 <a href="mailto:lennart.radenmark@o.lst.se">lennart.radenmark@o.lst.se</a></p>	<p><b>Lena Säljö</b> Verksamhetschef IFO och funktionshinder Biskopsgården Tel 031-366 64 38 <a href="mailto:Lena.saljo@biskopsgarden.goteborg.se">Lena.saljo@biskopsgarden.goteborg.se</a></p>



## Bilaga 2

### Delregionala arbetsgrupper

#### Delregional arbetsgrupp i Göteborg med omnejd

Samverkansgruppen för missbruks- och beroende frågor i Göteborg med omnejd (Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda, Öckerö) har representation från Kriminalvård, beroende- och primärvård och socialtjänst. Denna samverkansgrupp har beslutat sig för att utgöra en delregional arbetsgrupp för vårt projekt. Ordförande är Kristina Jung.

Göteborgs projektet är ett samverkans projekt för Göteborg där ovanstående samverkansgrupp är styrgrupp. Göteborgs projektet har också fått pengar från Länsstyrelsen för att arbeta med implementering av Nationella Riktlinjer i Göteborg, under en 2 års period. Projektledare är Staffan Schött.

#### Delregional arbetsgrupp i Fyrbodalen

”Vårdsamverkan Fyrbodalen” - Maria Bruhn är kontaktperson. Vårdsamverkan FyrBoDal är en gemensam arena för samverkansfrågor där primärvård (38 vårdcentraler), länssjukvård (5 sjukhus), hälso- och sjukvårdsnämnderna genom hälso- och sjukvårdskansliet samt 15 kommuner ingår. Sedan 2001 har denna grupp varit partsammansatt resursgrupp för samverkansfrågor inom psykiatri. Denna håller nu på att ombildas till en egen beredningsgrupp för psykiatri som också kommer att hantera missbruksfrågan. Om denna grupp kommer att utgöra delregional arbetsgrupp för Fyrbodalen är ännu inte utklarat.

#### Delregional arbetsgrupp i Skaraborg

Diskussion om hur sammansättningen av en delregional arbetsgrupp kan se ut pågår i Skaraborg. Kontaktperson för Skaraborgs kommunalförbund är Pia Jonsson-Axelsson.

#### Delregional arbetsgrupp i Sjuhärad

Diskussion om hur sammansättningen av en delregional arbetsgrupp kan se ut pågår i Fyrbodalen. Kontaktperson för Sjuhärads kommunalförbund är Gunilla Bothén.

## Bilaga 3



Kriminalvården

2008-01-24

## 10 Uppdragshandling

### 10.1

### 10.2 Bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

#### 10.2.1 Bakgrund

Socialstyrelsen publicerade i februari 2007 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna vände sig till såväl socialtjänstens som hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en introduktion till riktlinjerna har Socialstyrelsen anordnat ett antal regionala konferenser. Den 27 september 2007 anordnades en konferens för Västsverige i Göteborg. I samband med konferenserna presenterades också ett implementerings- och utbildningsstöd till riktlinjerna.

VästKom och Västra Götalandsregionen ansökte i maj 2007 hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om utvecklingsmedel för implementering av de nationella riktlinjerna. Medel söktes för att under två år bedriva projektet och bekosta två projektledare på halvtid, kompetensstödare och deras utbildning, delregionala halvdagskonferenser samt för informations- och kommunikationstjänster. En inbjudan till Kriminalvården att medverka skulle också göras.



Kriminalvården har i oktober gjort en kompletterande ansökan om projektmedel. De har ställt sig bakom VästKom och Västra Götalandsregionens ansökan och vill ingå i arbetet.

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 2 november 2007 beviljat 2 910 000 kronor för år 1 och 2 910 000 kronor för år 2. Totalt 5 820 000 kronor. Utvecklingsmedel har beviljats till ett gemensamt arbete mellan Kriminalvården, VästKom och Västra Götalandsregionens med en tvåårig satsning för att implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland.

Länsstyrelsen har begärt att Västkom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården/Region Väst senast den 1 februari 2008 inkommer med en gemensam preciserad planering för hur arbetet skall struktureras med implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i länet.

### 10.2.2 Uppdrag

Uppdraget innebär att implementera Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i enlighet med den ansökan som gjorts av VästKom och Västra Götalandsregionen 2007-05-09, ansökan från Kriminalvården/Väst 2007-10-08 samt Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel 2007-11-02.

### 10.2.3 Uppdragsgivare

Regiondirektör Lennart Palmgren, Kriminalvården/Region Väst,  
Direktör Dan Gustafsson, VästKom, och  
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist, Västra Götalandsregionen.

### 10.2.4 Avgränsning, mål och syfte

Ett lokalt förankrat arbete kring riktlinjerna med stöd från regional nivå skall kunna leda till ett länsövergripande samarbete för missbruks- och beroendevården. Med utgångspunkt i riktlinjerna bör grupper i de olika länsdelarna formulera vilken vård och stöd kriminalvård, kommuner och hälso- och sjukvård kan erbjuda lokalt idag och den utveckling som är nödvändig. De nationella riktlinjerna skall anpassas efter lokala förhållanden och bidra till utveckling av struktur för samverkan. Denna struktur bör resultera i rutiner för samverkan i Västra Götaland.

Ytterst syftar arbetet till att stärka och utveckla vårdkedjearbetet i synnerhet för personer med tungt missbruk. En förutsättning för detta är att den kunskap som finns dokumenterad i riktlinjerna blir känd och använd.



### 10.2.5 Koppling till och samverkan med andra organisationer, projekt eller uppdrag

En förutsättning för Länsstyrelsens utbetalning av medlen är att arbetet samordnas med Sociala resursnämnden i Göteborg som även beviljats utvecklingsmedel till en resurs för implementeringen av riktlinjerna samt för att utveckla Kunskapskällarnas hemsida. Hemsidan skall utvecklas så att den kan användas som en resurs och stöd/verktyg av samtliga kommuner i länet i arbetet med implementering av nationella riktlinjer.

Samverkan och samordning bör också ske med andra parallella aktiviteter hos andra huvudmän, som exempelvis Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor.


### 10.2.6 Organisation

Styrgrupp utgörs av Jan-Eric Josefsson, Kriminalvården Region Väst, Pia Jonsson-Axelsson, Skaraborgs kommunalförbund, och av Christina Möller, Västra Götalandsregionen.

Projektgrupp utgörs av två företrädare för länets kommuner, en företrädare från missbruks- och beroendevården, en företrädare från primärvården och en företrädare för kriminalvården. Referensgrupp utgörs av sakkunniga från Kriminalvården, Socialtjänsten, Missbruks- och beroendevården, samt Primärvården.

Fyra delregionala arbetsgrupper utgörs av representanter från de tre huvudmännen och som är verksamma i Göteborg med kranskommuner, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.

Se nedanstående organisationsskiss.

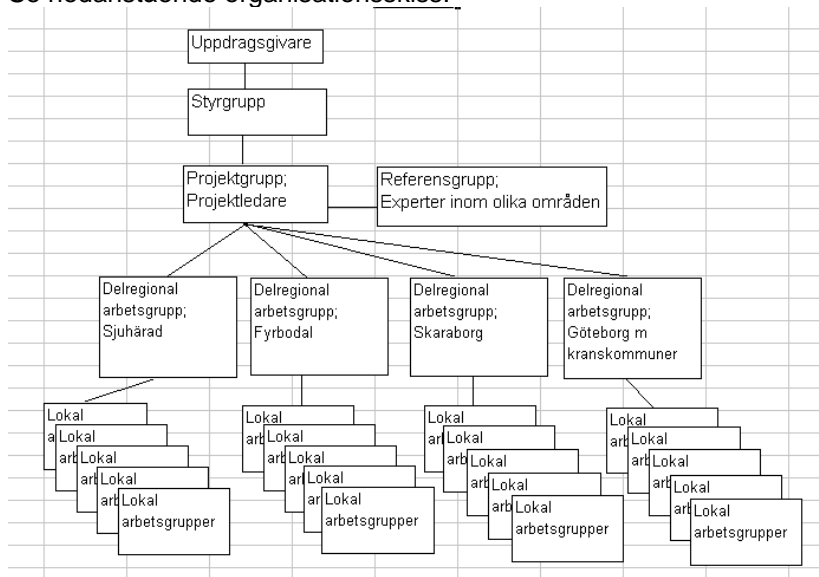

### 10.2.7

### 10.2.8 Genomförande och tidplan

Utifrån de erfarenheter som vunnits genom den särskilda psykiatrisatsningen och VästBus, bör arbetet ske lokalt i länet men stöddas av en länsgemensam projektgrupp och delregionala arbetsgrupper. Kriminalvården ansluter med representation i de delregionala arbetsgrupperna. Satsningen skall involvera såväl politiker, chefer och medarbetare i alla 49 kommuner inom socialtjänstens missbruksvård, kriminalvården samt hälso- och sjukvårdens beroendevård och primärvård.

#### **Tidplan**

##### **Våren 2008 (jan – mars)**

Samrådsorganet mellan Västkom och VGR samt Kriminalvården/Väst utgör styrgrupp genom ansvariga tjänstemän.

Huvudmännen lämnar senast den 1 februari 2008 en preciserad planering för implementeringsarbetet till Länsstyrelsen.

Projektledare anställs. Vardera huvudman kommer att bidra med 1 – 2 personer.

Referensgrupp bildas.

Projektgruppens uppdrag är att leda arbetet med implementering av riktlinjerna och efter samråd med referensgruppen arbeta fram en detaljerad plan för implementeringsprocessen.

##### **Våren 2008 (maj – juni)**

Planeringsprocess inför implementeringsarbetet.

##### **Hösten 2008 och framåt**

Implementeringsarbetet påbörjas i enlighet med framtagen plan.

Lokala arbetsgrupper bildas som stöd i implementeringsarbetet.

Det lokala studiearbetet kring teman kan inledas med en delregional konferens och föreläsning från någon av de experter som deltagit i arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna. Dessa halvdagskonferenser anordnas i varje kommunförbunds/sjukhusområde dit såväl lokala politiker, chefer och medarbetare inbjuds. Som ytterligare hjälp i det fortsatta lokala arbetet kan Socialstyrelsens Implementerings- och utbildningsstöd användas.

Huvudmännen lämnar genom VästKoms försorg delrapporter till  
Länsstyrelsen.

### Hösten 2009

Rutiner för samverkan inom missbruks- och beroendevården i Västra Götaland tas fram.

#### 10.2.9 Finansiering/Resursåtgång

Utvecklingsmedel har beviljats till ett gemensamt arbete med en tvåårig satsning i länet för att implementera de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland. På årsbasis avser medlen tre heltids projektledare, 550 000 kr/tjänst till kommunerna, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården. Dessutom har 240 000 kronor beviljats till tvådagarsinternat för utbildning av kompetensstödjare, 920 000 kronor till 20 delregionala halvdagskonferenser i länet samt 100 000 kronor till information och kommunikation. Totalt har Länsstyrelsen beviljat 2 910 000 kronor/år.

Medlen för år 1 betalas ut med 2/3 efter det att aktiviteten kommit igång och VästKom anmält detta till Länsstyrelsen. Resterande tredjedelen för det första året och 2/3 av beviljade medel för år 2 utbetalas efter det att VästKom inkommit med en delrapport, dock tidigast nio månader efter första utbetalningen. Resterande tredjedel för andra året utbetalas när VästKom inkommit med slutrapport för det gemensamma arbetet med implementering.

#### 10.2.10 Underskrift

Dan Gustafsson  
Direktör

Lars-Olof Rönnqvist  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Lenart Palmgren  
Regiondirektör



## Bilaga 4

### Tidplan

Konferens 1: Om riktlinjernas tillämpbarhet, gemensamma definitioner mm (kap 1)  
Översikt om rekommendationer, evidens, evidensbaserad praktik,  
behandlingsforskning (kap 2, bilaga 3)

Konferens 2: Tidig upptäckt – tidiga insatser  
Bedömningsinstrument och dokumentation (kap 3 och 4)

Konferens 3: Narkotika – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling (kap 5)

Konferens 4: Alkohol – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling (kap 6)

Konferens 5: Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk/somatisk sjukdom (kap 8)

Konferens 6: Gravida kvinnor – gemensam konferens för hela Västra Götaland

Projektet kommer att hålla en kontinuerlig kontakt och dialog med delregionala arbetsgrupper under projektiden.

#### 2008

Våren/sommaren	Inventering och projektplan. Börja knyta kontakta med delregionala arbetsgrupper
Hösten	Delregionala arbetsgrupper bildas
Okt/November	<u>Konferens 1</u> Om riktlinjernas tillämpbarhet, gemensamma definitioner mm (kap 1) Översikt om rekommendationer, evidens, evidensbaserad praktik, behandlingsforskning (kap 2, bilaga 3) Föreläsare; Jan Blomqvist
December	Delrapport Länsstyrelsen

#### 2009

Februari	<u>Konferens 2</u> : Tidig upptäckt – tidiga insatser Bedömningsinstrument och dokumentation (kap 3 och 4) Föreläsare; Sven Andreasson
Mars	<u>Konferens 3</u> : Narkotika – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling (kap 5)



Föreläsare Mats Fridell

April	<u>Utbildning av kompetensstödjare, hela regionen.</u> Ev. två konferenser, se nov 2009
September	<u>Konferens 4:</u> Alkohol – psykosocial behandling och läkemedelsbehandling (kap 6)
Oktober	<u>Konferens 5:</u> Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk/somatisk sjukdom (kap 8)
November	Ev. <u>utbildning av kompetensstödjare i hela regionen,</u> se mars 2009.
November	<u>Konferens 6 :</u> Gravida kvinnor – gemensam konferens för hela Västra Götaland, MVC personal
<u>2010</u>	
Januari	Uppföljning – kompetensstödjarnas arbete, samverkansrutiner, träff med delregionala arbetsgrupper mm
Februari	Slutsammanställning av hur långt arbetet fortskridit vad gäller samverkansrutiner/samverkansstrukturer
Mars-	Sammanställning av projektet – slutrapport till länsstyrelsen.

Utvärdering sker enligt särskild plan
